

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立関沢小学校大規模改造建築工事（第2期工事）
- 2 施工場所 富士見市関沢3丁目地内
- 3 履行期限 平成30年10月15日
- 4 請負金額 289,072,800円
- 5 請負業者 川越市富士見町9番地1  
三ツ和総合建設業協同組合埼玉西支店  
支店長 吉田昌弘

平成30年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

市立関沢小学校大規模改造建築工事（第2期工事）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

## 制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立関沢小学校大規模改造建築工事（第2期工事）
2. 設計額 297,400,000円（税抜）  
321,192,000円（税込）
3. 予定価格 297,400,000円（税抜）  
321,192,000円（税込）
4. 最低制限価格 267,660,000円（税抜）  
289,072,800円（税込）
5. 参加業者数 9社
6. 開札日時 平成30年4月26日 午前9時
7. 入札一覧

業者名	入札金額（円税抜）	落札者	摘要
株式会社田中工業 川越営業所			辞退
初雁興業株式会社 本店	267,660,000		くじ
三光建設株式会社 本店	267,660,000		くじ
斎藤工業株式会社 埼玉西営業所	267,660,000		くじ
株式会社富士見工務店 本店	267,660,000		くじ
株式会社大嶋技建 本店	267,660,000		くじ
三ツ和総合建設業協同組合 埼玉西支店	267,660,000	○	くじ
和光建設株式会社 富士見支店	267,660,000		くじ
島田建設株式会社 本店	294,600,000		

# 市立関沢小学校大規模改造建築工事（第2期工事）について

## ・ 工事概要


- ・ 大規模改造工事（外壁改修、内装改修、建具改修、防水改修、トイレ改修等）


・ 履行期限 平成30年10月15日

・ 請負金額 289,072,800円

・ 請負業者 三ツ和総合建設業協同組合埼玉西支店  
支店長 吉田昌弘

## ・ 工事範囲


 大規模改造工事（第2期工事）の工事範囲

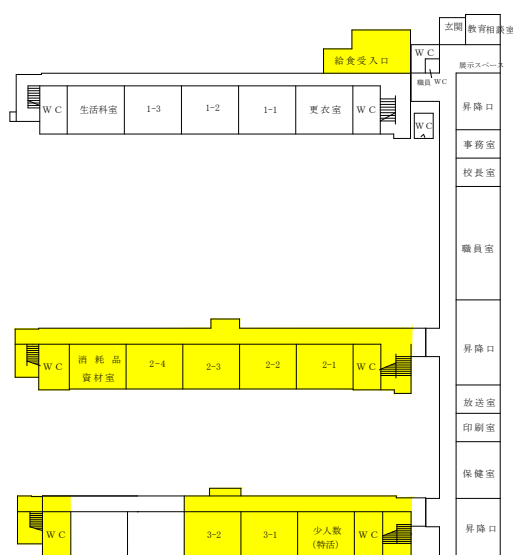

1 階



2 階



3 階

・市立関沢小学校大規模改造建築工事（第2期工事）スケジュール（案）

6月															7月															8月															9月															10月														
契約																														夏 休 み 期 間																																												
工事準備期間																																																																										
															仮設工事																																																											
															外壁改修工事																																																											
															中校舎、中校舎東側トイレ、南校舎西トイレ工事																																																											
															中校舎西側トイレ工事																																																											
															南校舎、南校舎東側トイレ工事																																																											
															北校舎トイレ、舗装工事																																																											
																														仮設撤去																																												
																																																												雑工事														

主な工事工程

- ・仮設工事 6月中旬から
  - ・外壁改修工事 6月中旬から8月20日まで
  - ・中校舎、中校舎東側トイレ、南校舎西トイレ工事 6月中旬から8月20日まで
  - ・中校舎西側トイレ工事 6月中旬から9月28日まで
  - ・南校舎、南校舎東側トイレ工事 7月21日から9月28日まで
  - ・北校舎トイレ、舗装工事 7月21日から8月20日まで
- ※6月中旬から1学期終業式までの解体工事等(騒音がでる工事)は、学校の休日に行う。

・その他

- ・市立関沢小学校大規模改造電気設備工事(第2期工事)

【工事概要】

分電盤更新、照明器具・配線器具の更新、放送設備の更新、自動火災報知設備の更新等

【履行期限】

平成30年10月15日

- ・市立関沢小学校大規模改造機械設備工事(第2期工事)

【工事概要】

空調機新設・撤去再取付、給排水管更新等

【履行期限】

平成30年10月15日
