

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 木染橋耐震補強等工事（第3期）
- 2 施工場所 富士見市大字下南畑地内ほか
- 3 履行期限 令和2年3月27日
- 4 請負金額 145,775,300円
- 5 請負業者 富士見市大字下南畑2343番地3
株式会社富士実業
代表取締役 石橋美佐

令和元年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

木染橋耐震補強等工事（第3期）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。



制限付一般競争入札結果について

- 1 工事名 木染橋耐震補強等工事（第3期）
- 2 設計額 148,226,000円（税抜）
163,048,600円（税込）
- 3 予定価格 148,226,000円（税抜）
163,048,600円（税込）
- 4 最低制限価格 132,305,000円（税抜）
145,535,500円（税込）
- 5 参加業者数 4社
- 6 開札日時 令和元年8月26日午前9時

7 入札一覧

業者名	入札金額（円税抜）	落札者	摘要
株式会社松永建設 富士見営業所	132,221,200		失格
株式会社富士実業 本店	132,523,000	○	
島田建設株式会社 本店	140,000,000		
株式会社伊藤土木 富士見営業所	148,226,000		

木染橋耐震補強等工事（第3期）について

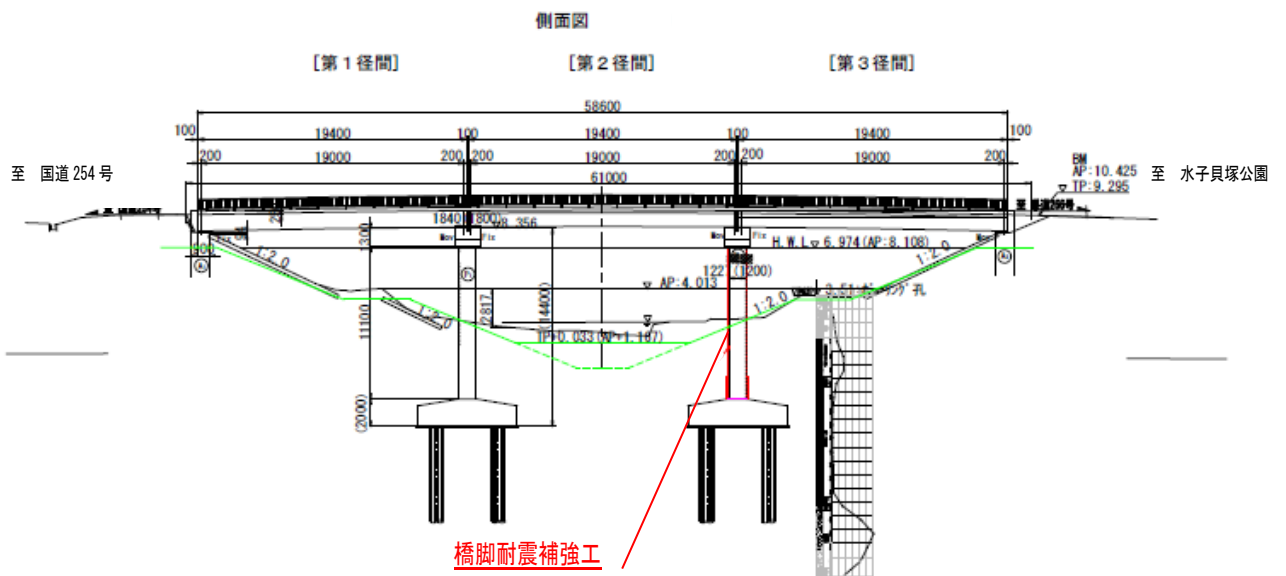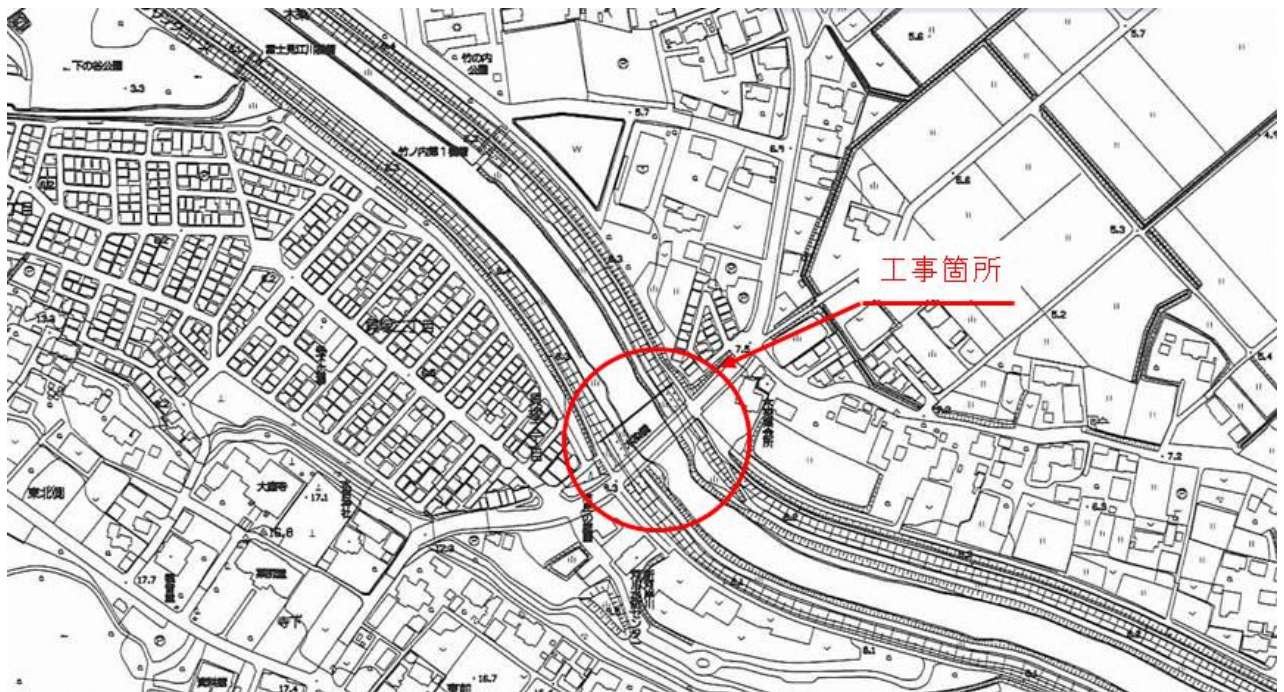

1 工事概要

橋脚耐震補強工 一式 張ブロック 一式 足場工 一式

仮締切工 一式 掘削・埋戻し 一式 仮設道路 一式

2 履行期限

令和2年3月27日

3 請負金額

145,775,300円

4 請負業者

富士見市大字下南畑2343番地3

株式会社富士実業

代表取締役 石橋美佐

工事工程表

作業項目	令和元年			令和2年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備	←→					
仮設道路		←→ 設置				←→ 撤去
仮締切工		←→ 設置		←→ 撤去		
掘削・埋戻し		←→ 掘削		←→ 埋戻し		
橋脚耐震補強工			←→			
張ブロック		←→ 撤去		←→ 復旧		
片付け						←→
